

COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)

H_01

CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA

COMMITTENTE:

COMUNE DI GAMBETTOLA,
Piazza Risorgimento n.6 - 47035 Gambettola FC

LAVORI:

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL
PARCO RIO RIGONCELLO
CUP: H92H23000500006

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - AGGIORNATO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Arch. Matteo Battistini

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RUP:

Ing. Mirco Menghetti

E

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0013410/2025 del 28/08/2025

Firmatario: MATTEO BATTISTINI

COMUNE DI GAMBETTOLA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA


Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO


COMMITTENTE: COMUNE DI GAMBETTOLA

MONTIANO, 10/02/2025

Il Tecnico
(ARCH. MATTEO BATTISTINI)

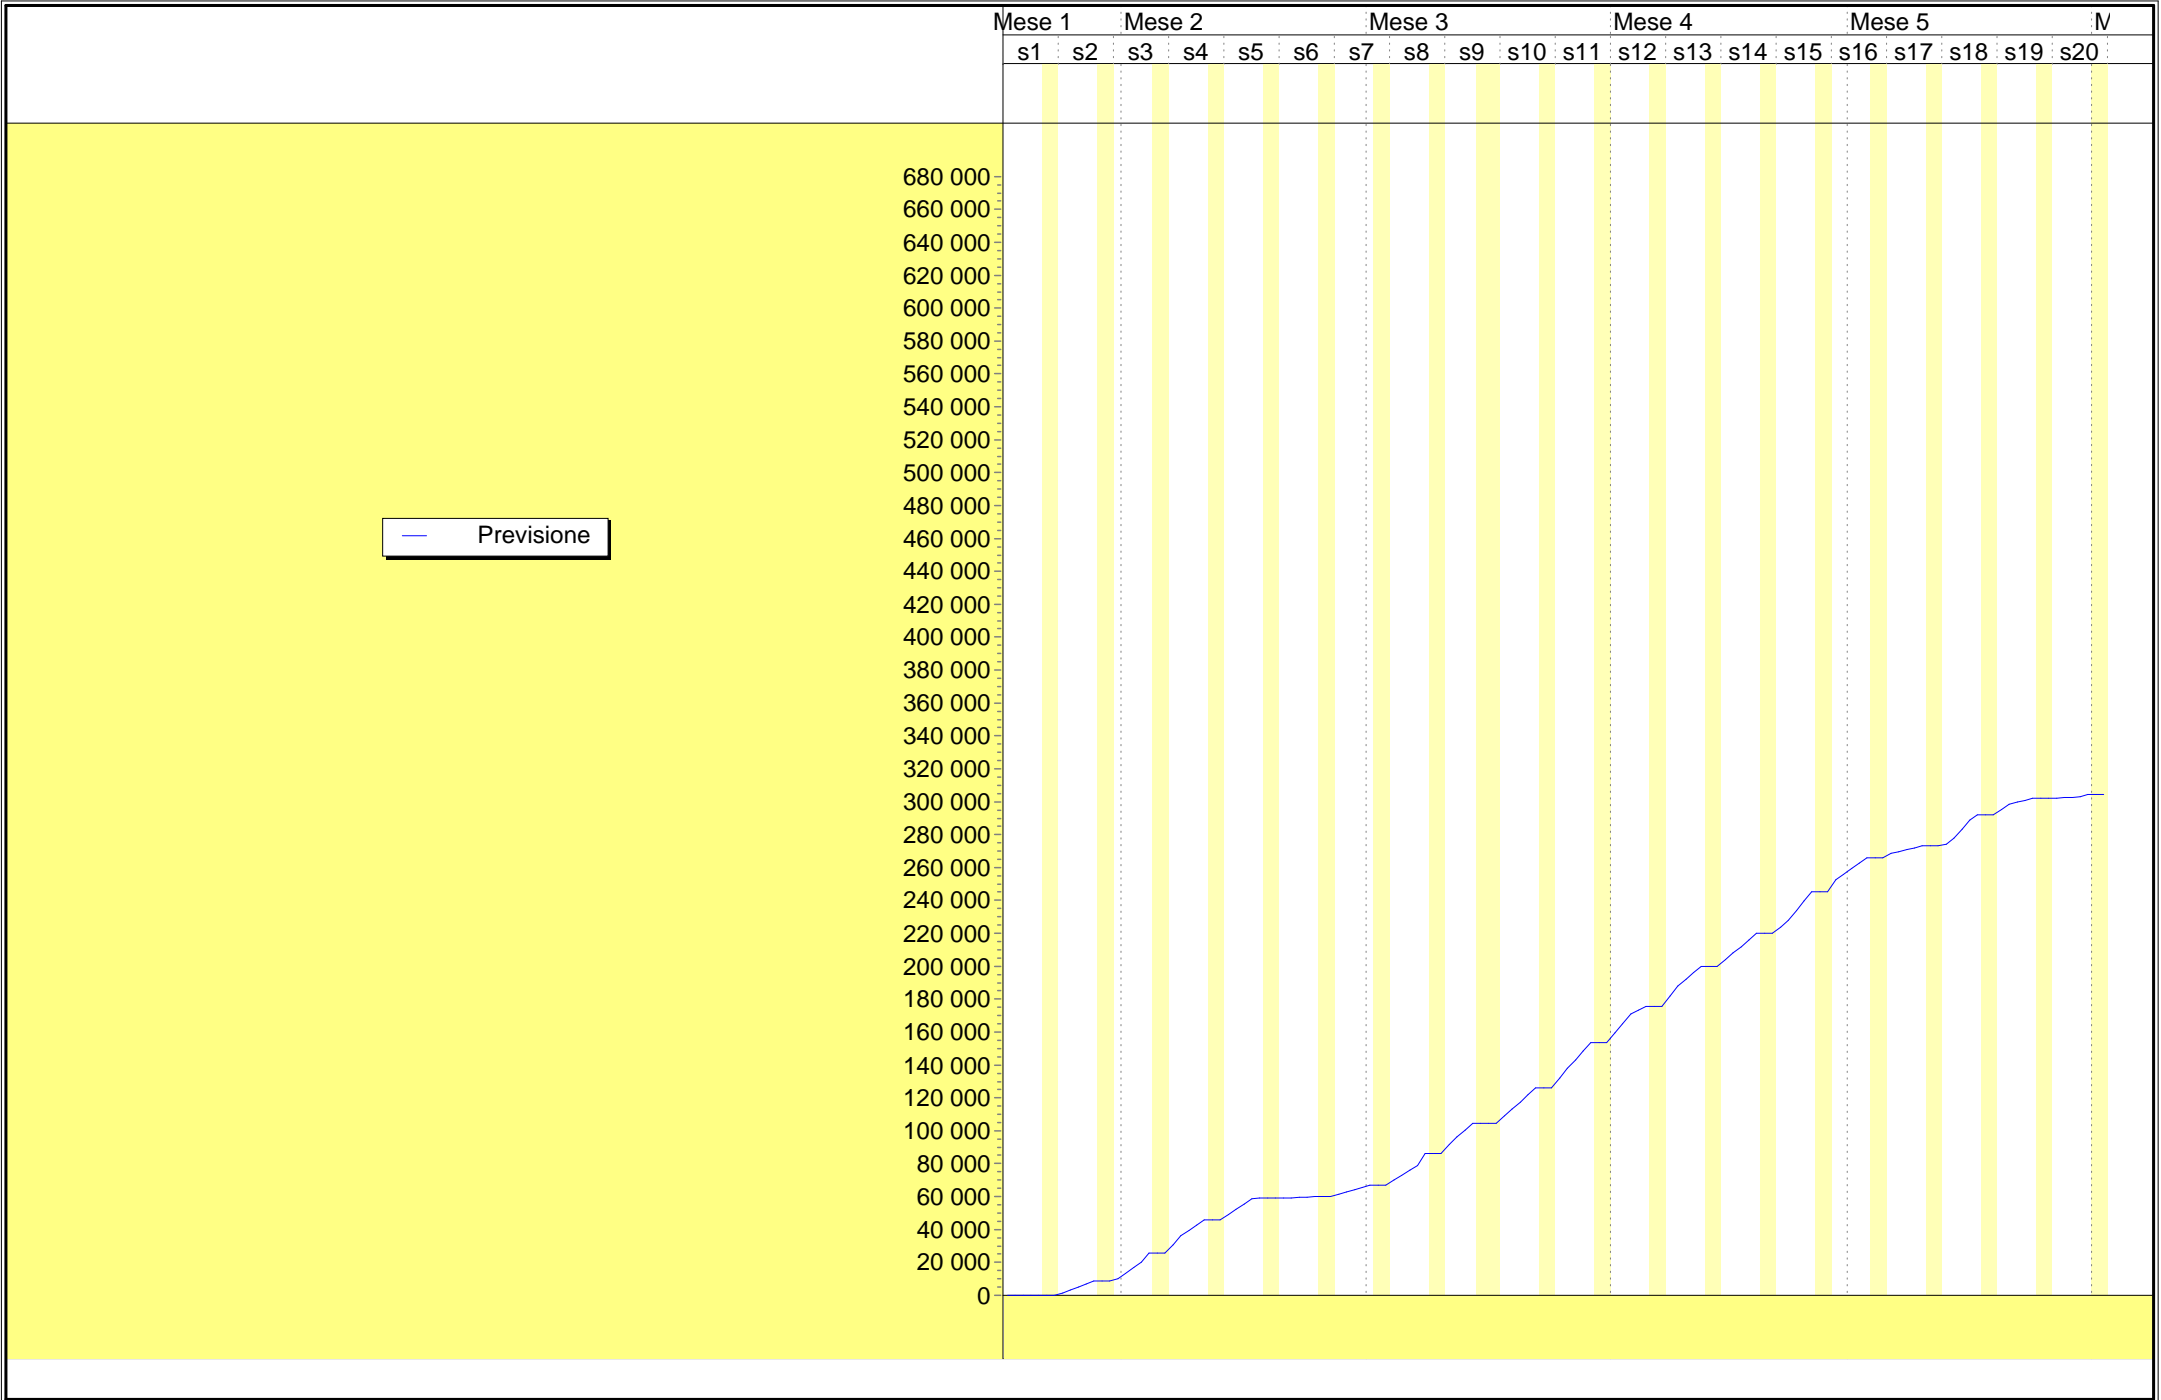



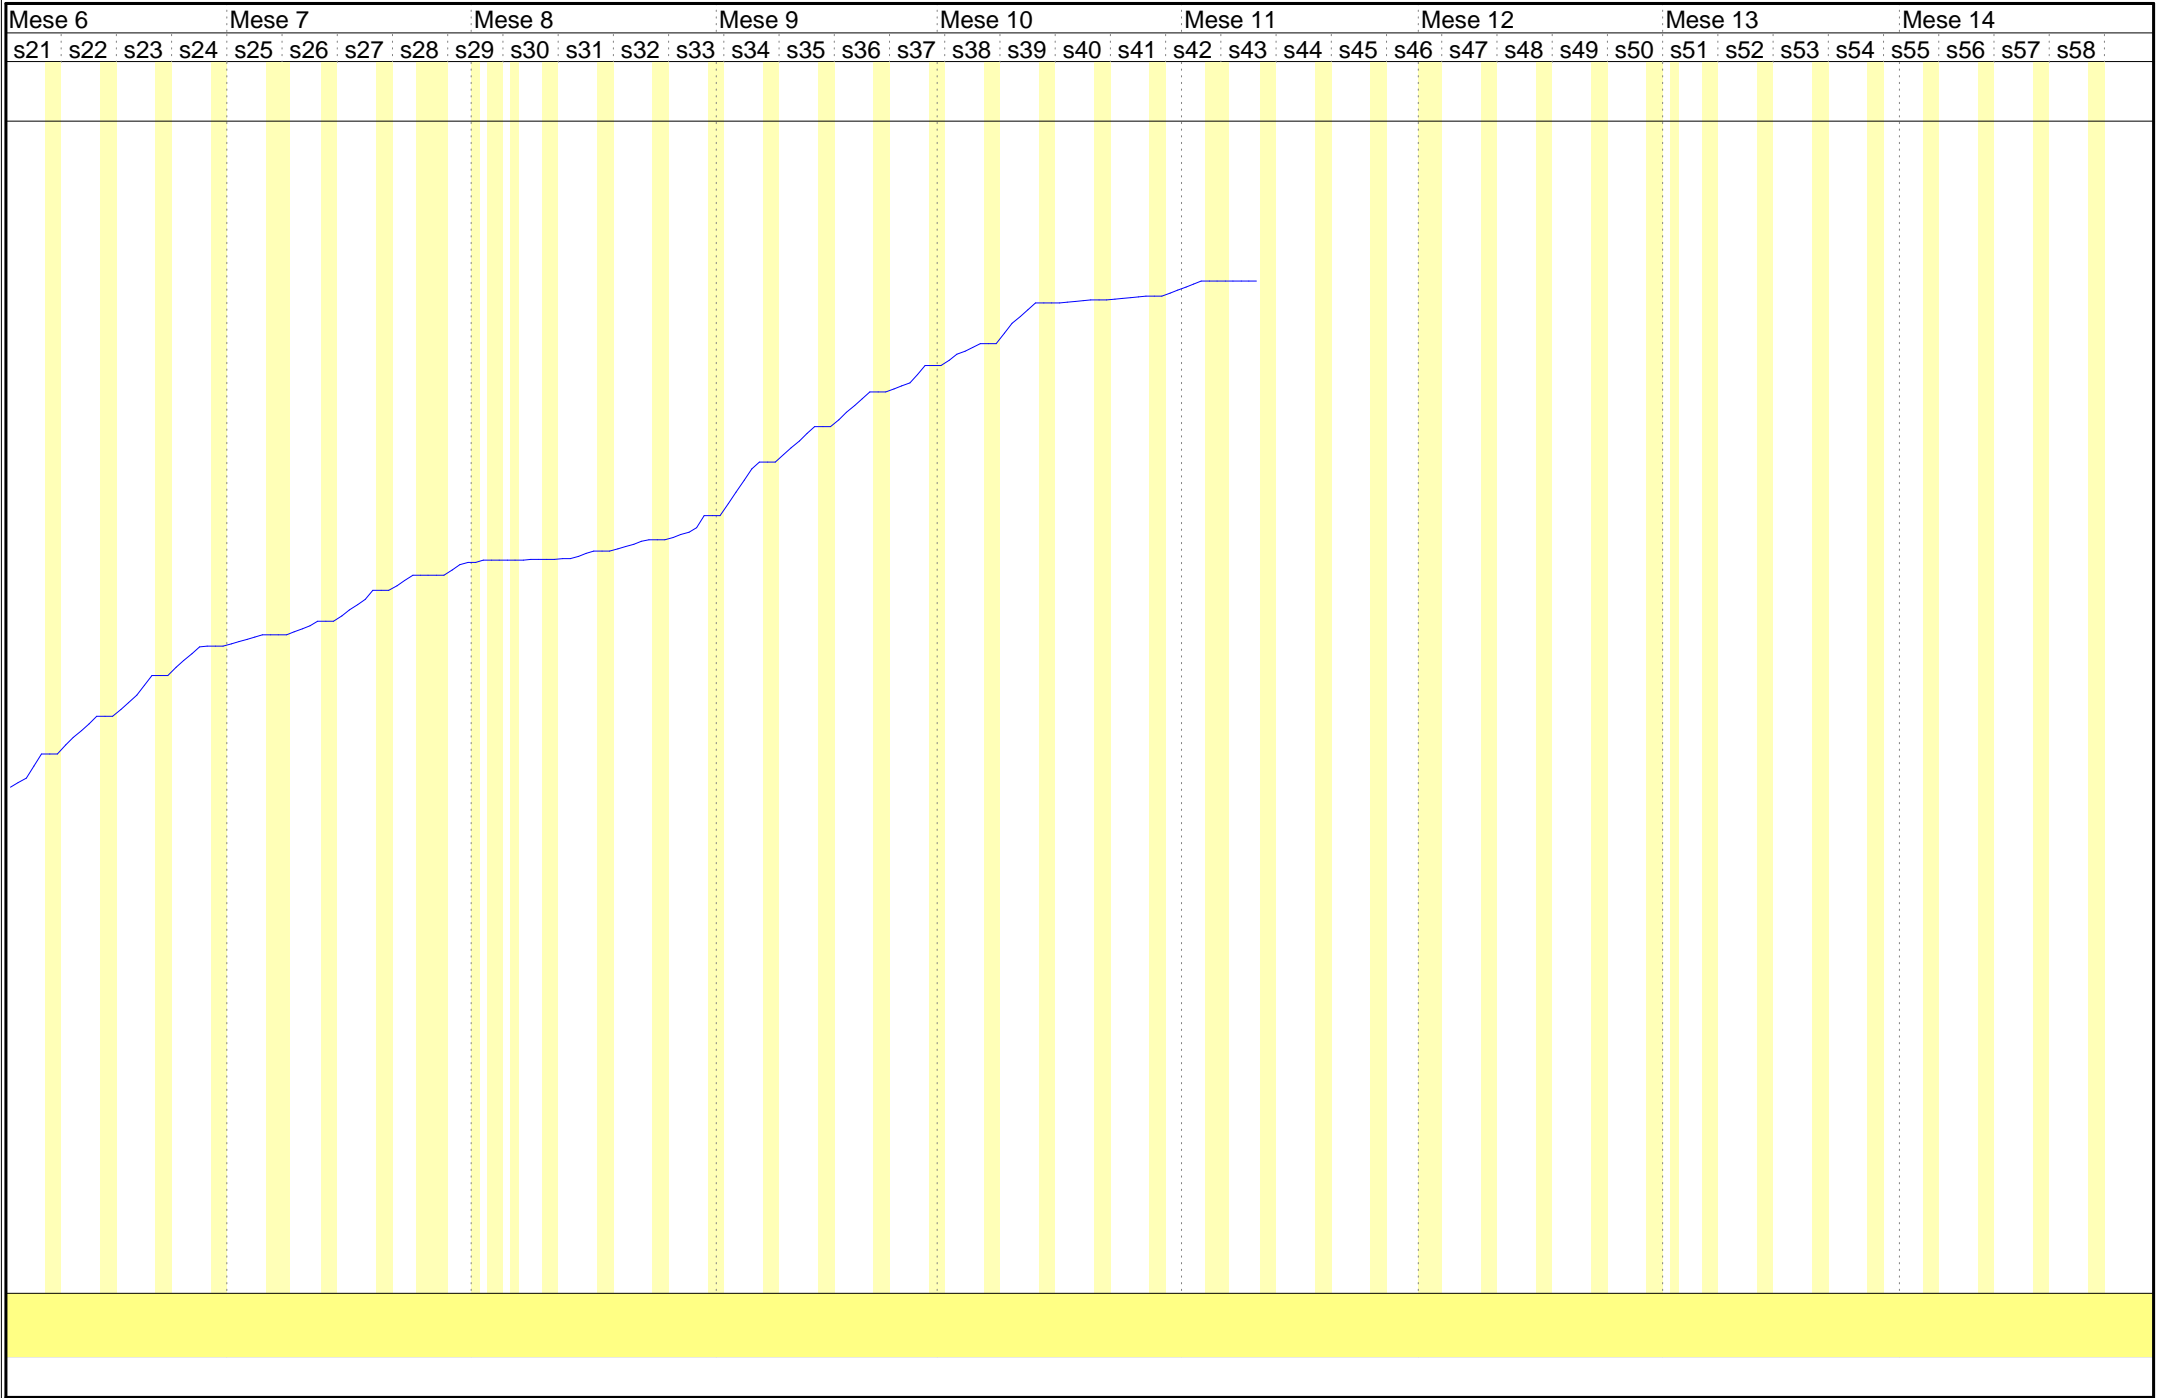

COMUNE DI GAMBETTOLA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Tabella Attività

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO

COMMITTENTE: COMUNE DI GAMBETTOLA

MONTIANO, 10/02/2025

Il Tecnico
(ARCH. MATTEO BATTISTINI)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI		
	euro	(%)			Lav.	Tot.	
Allestimento cantiere	0,00	0,000	1 gg	166 gg	15	15	
	<i>periodo 01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>1 gg</i>	<i>5 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>99 gg</i>	<i>103 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>162 gg</i>	<i>166 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
demolizioni e rimozioni	28'511,71	4,635	8 gg	180 gg	20	25	
	<i>periodo 01</i>	<i>7'127,93</i>	<i>1,159</i>	<i>8 gg</i>	<i>12 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>8'553,51</i>	<i>1,390</i>	<i>106 gg</i>	<i>113 gg</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>12'830,27</i>	<i>2,086</i>	<i>169 gg</i>	<i>180 gg</i>	<i>9</i>	<i>12</i>
scavi e rinterri	29'327,44	4,768	15 gg	201 gg	42	59	
	<i>periodo 01</i>	<i>9'678,06</i>	<i>1,573</i>	<i>15 gg</i>	<i>32 gg</i>	<i>14</i>	<i>18</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>10'557,88</i>	<i>1,716</i>	<i>113 gg</i>	<i>131 gg</i>	<i>15</i>	<i>19</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>9'091,51</i>	<i>1,478</i>	<i>180 gg</i>	<i>201 gg</i>	<i>13</i>	<i>22</i>
trasporti	9'607,44	1,562	9 gg	201 gg	49	68	
	<i>periodo 01</i>	<i>3'554,75</i>	<i>0,578</i>	<i>9 gg</i>	<i>32 gg</i>	<i>18</i>	<i>24</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>2'978,31</i>	<i>0,484</i>	<i>113 gg</i>	<i>131 gg</i>	<i>15</i>	<i>19</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>3'074,38</i>	<i>0,500</i>	<i>177 gg</i>	<i>201 gg</i>	<i>16</i>	<i>25</i>
oneri di scarica	11'906,81	1,936	9 gg	201 gg	49	68	
	<i>periodo 01</i>	<i>4'405,52</i>	<i>0,716</i>	<i>9 gg</i>	<i>32 gg</i>	<i>18</i>	<i>24</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>3'691,11</i>	<i>0,600</i>	<i>113 gg</i>	<i>131 gg</i>	<i>15</i>	<i>19</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>3'810,18</i>	<i>0,619</i>	<i>177 gg</i>	<i>201 gg</i>	<i>16</i>	<i>25</i>
sottofondi	41'755,50	6,788	43 gg	235 gg	33	43	
	<i>periodo 01</i>	<i>12'526,65</i>	<i>2,036</i>	<i>43 gg</i>	<i>54 gg</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>7'515,99</i>	<i>1,222</i>	<i>138 gg</i>	<i>145 gg</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>21'712,86</i>	<i>3,530</i>	<i>213 gg</i>	<i>235 gg</i>	<i>17</i>	<i>23</i>
malte, conglomerati cementizi, casseforme e acciaio per cemento armato	4'291,37	0,698	29 gg	229 gg	27	28	
	<i>periodo 01</i>	<i>815,36</i>	<i>0,133</i>	<i>29 gg</i>	<i>33 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>815,36</i>	<i>0,133</i>	<i>50 gg</i>	<i>54 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 03</i>	<i>472,05</i>	<i>0,077</i>	<i>127 gg</i>	<i>129 gg</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>periodo 04</i>	<i>815,36</i>	<i>0,133</i>	<i>141 gg</i>	<i>145 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 05</i>	<i>643,71</i>	<i>0,105</i>	<i>197 gg</i>	<i>201 gg</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>periodo 06</i>	<i>729,53</i>	<i>0,119</i>	<i>225 gg</i>	<i>229 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
cigli e cordoli	27'688,40	4,501	50 gg	235 gg	18	24	
	<i>periodo 01</i>	<i>9'137,17</i>	<i>1,485</i>	<i>50 gg</i>	<i>57 gg</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
	<i>periodo 02</i>	<i>9'137,17</i>	<i>1,485</i>	<i>141 gg</i>	<i>148 gg</i>	<i>6</i>	<i>8</i>

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
guaine, membrane, drenaggi	<i>periodo 03</i>	9'414,06	1,530	228 gg	235 gg	6	8
		5'665,16	0,921	36 gg	221 gg	29	38
	<i>periodo 01</i>	1'926,15	0,313	36 gg	47 gg	10	12
	<i>periodo 02</i>	1'189,68	0,193	134 gg	141 gg	6	8
	<i>periodo 03</i>	2'549,32	0,414	204 gg	221 gg	13	18
pavimentazioni		170'633,28	27,739	54 gg	250 gg	40	57
	<i>periodo 01</i>	51'189,98	8,322	54 gg	72 gg	12	19
	<i>periodo 02</i>	51'189,98	8,322	144 gg	159 gg	12	16
	<i>periodo 03</i>	68'253,31	11,095	229 gg	250 gg	16	22
pozzetti, chiusini, cavidotti, plinti prefabbricati		41'409,45	6,732	19 gg	198 gg	21	33
	<i>periodo 01</i>	19'876,54	3,231	19 gg	32 gg	10	14
	<i>periodo 02</i>	9'938,27	1,616	122 gg	128 gg	5	7
	<i>periodo 03</i>	11'594,65	1,885	187 gg	198 gg	6	12
impianto d'irrigazione		58'729,09	9,547	16 gg	268 gg	26	32
	<i>periodo 01</i>	13'507,69	2,196	16 gg	23 gg	6	8
	<i>periodo 02</i>	15'856,85	2,578	78 gg	86 gg	7	9
	<i>periodo 03</i>	7'047,49	1,146	121 gg	123 gg	3	3
	<i>periodo 04</i>	11'158,53	1,814	183 gg	187 gg	5	5
	<i>periodo 05</i>	11'158,53	1,814	262 gg	268 gg	5	7
opere da giardiniere		83'712,29	13,609	85 gg	271 gg	21	27
	<i>periodo 01</i>	63'621,34	10,342	85 gg	106 gg	16	22
	<i>periodo 02</i>	20'090,95	3,266	267 gg	271 gg	5	5
arredi urbani		24'298,58	3,950	101 gg	292 gg	13	15
	<i>periodo 01</i>	15'065,12	2,449	101 gg	110 gg	8	10
	<i>periodo 02</i>	9'233,46	1,501	288 gg	292 gg	5	5
segnaletica orizzontale e verticale		5'932,07	0,964	163 gg	285 gg	13	15
	<i>periodo 01</i>	1'838,94	0,299	163 gg	166 gg	4	4
	<i>periodo 02</i>	4'093,13	0,665	275 gg	285 gg	9	11
impianto di illuminazione		49'393,34	8,030	73 gg	261 gg	14	18
	<i>periodo 01</i>	21'239,14	3,453	73 gg	80 gg	6	8
	<i>periodo 02</i>	14'324,07	2,329	162 gg	165 gg	4	4
	<i>periodo 03</i>	13'830,14	2,248	256 gg	261 gg	4	6

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
alimentazione elettrica - illuminazione pubblica	13'465,09	2,189	71 gg	257 gg	13	15
<i>periodo 01</i>	<i>5'116,73</i>	<i>0,832</i>	<i>71 gg</i>	<i>75 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>periodo 02</i>	<i>3'096,97</i>	<i>0,503</i>	<i>158 gg</i>	<i>162 gg</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>periodo 03</i>	<i>5'251,39</i>	<i>0,854</i>	<i>253 gg</i>	<i>257 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
alimentazione elettrica - forza motrice	8'819,06	1,434	71 gg	257 gg	13	15
<i>periodo 01</i>	<i>3'351,24</i>	<i>0,545</i>	<i>71 gg</i>	<i>75 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>periodo 02</i>	<i>2'028,38</i>	<i>0,330</i>	<i>158 gg</i>	<i>162 gg</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>periodo 03</i>	<i>3'439,43</i>	<i>0,559</i>	<i>253 gg</i>	<i>257 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Smobilizzo cantiere	0,00	0,000	113 gg	299 gg	14	14
<i>periodo 01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>113 gg</i>	<i>117 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>periodo 02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>169 gg</i>	<i>173 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>periodo 03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>296 gg</i>	<i>299 gg</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
MONTIANO, 10/02/2025						
Tecnico ARCH. MATTEO BATTISTINI						

COMUNE DI GAMBETTOLA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO

COMMITTENTE: COMUNE DI GAMBETTOLA

MONTIANO, 10/02/2025

Il Tecnico
(ARCH. MATTEO BATTISTINI)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
8 gg	1'425,59	1'425,59	0,232
9 gg	1'867,82	3'293,41	0,535
10 gg	1'867,82	5'161,23	0,839
11 gg	1'867,82	7'029,05	1,143
12 gg	1'867,82	8'896,88	1,446
15 gg	1'133,53	10'030,40	1,631
16 gg	3'384,81	13'415,21	2,181
17 gg	3'384,81	16'800,02	2,731
18 gg	3'384,81	20'184,83	3,281
19 gg	5'372,46	25'557,29	4,155
22 gg	5'372,46	30'929,76	5,028
23 gg	5'372,46	36'302,22	5,901
24 gg	3'121,18	39'423,40	6,409
25 gg	3'121,18	42'544,58	6,916
26 gg	3'121,18	45'665,76	7,424
29 gg	3'284,25	48'950,01	7,957
30 gg	3'284,25	52'234,26	8,491
31 gg	3'284,25	55'518,52	9,025
32 gg	3'284,25	58'802,77	9,559
33 gg	163,07	58'965,84	9,586
36 gg	192,62	59'158,46	9,617
37 gg	192,62	59'351,07	9,648
38 gg	192,62	59'543,69	9,680
39 gg	192,62	59'736,30	9,711
40 gg	192,62	59'928,92	9,742
43 gg	1'445,28	61'374,20	9,977
44 gg	1'445,28	62'819,48	10,212
45 gg	1'445,28	64'264,76	10,447
46 gg	1'445,28	65'710,04	10,682
47 gg	1'445,28	67'155,32	10,917
50 gg	2'938,60	70'093,92	11,395
51 gg	2'938,60	73'032,52	11,872
52 gg	2'938,60	75'971,12	12,350
53 gg	2'938,60	78'909,72	12,828
54 gg	7'204,43	86'114,15	13,999
57 gg	5'788,69	91'902,84	14,940
58 gg	4'265,83	96'168,67	15,633
59 gg	4'265,83	100'434,51	16,327
60 gg	4'265,83	104'700,34	17,020
64 gg	4'265,83	108'966,17	17,714

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
65 gg	4'265,83	113'232,00	18,407
66 gg	4'265,83	117'497,83	19,101
67 gg	4'265,83	121'763,67	19,794
68 gg	4'265,83	126'029,50	20,488
71 gg	5'959,43	131'988,93	21,457
72 gg	5'959,43	137'948,35	22,425
73 gg	5'233,45	143'181,81	23,276
74 gg	5'233,45	148'415,26	24,127
75 gg	5'233,45	153'648,71	24,978
78 gg	5'805,12	159'453,83	25,921
79 gg	5'805,12	165'258,95	26,865
80 gg	5'805,12	171'064,07	27,809
81 gg	2'265,26	173'329,34	28,177
82 gg	2'265,26	175'594,60	28,545
85 gg	6'241,60	181'836,20	29,560
86 gg	6'241,60	188'077,80	30,574
87 gg	3'976,33	192'054,13	31,221
88 gg	3'976,33	196'030,47	31,867
89 gg	3'976,33	200'006,80	32,514
92 gg	3'976,33	203'983,13	33,160
93 gg	3'976,33	207'959,47	33,807
94 gg	3'976,33	211'935,80	34,453
95 gg	3'976,33	215'912,13	35,099
96 gg	3'976,33	219'888,47	35,746
99 gg	3'976,33	223'864,80	36,392
100 gg	3'976,33	227'841,14	37,039
101 gg	5'859,47	233'700,61	37,991
102 gg	5'859,47	239'560,08	38,944
103 gg	5'859,47	245'419,56	39,896
106 gg	7'285,06	252'704,62	41,080
107 gg	3'308,73	256'013,34	41,618
108 gg	3'308,73	259'322,07	42,156
109 gg	3'308,73	262'630,79	42,694
110 gg	3'308,73	265'939,52	43,232
113 gg	2'574,07	268'513,59	43,650
114 gg	1'148,49	269'662,08	43,837
115 gg	1'148,49	270'810,56	44,024
116 gg	1'148,49	271'959,05	44,210
117 gg	1'148,49	273'107,54	44,397
120 gg	1'148,49	274'256,02	44,584

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
121 gg	3'497,65	277'753,67	45,152
122 gg	5'485,30	283'238,98	46,044
123 gg	5'485,30	288'724,28	46,936
124 gg	3'136,14	291'860,42	47,446
127 gg	3'293,49	295'153,91	47,981
128 gg	3'293,49	298'447,40	48,517
129 gg	1'305,84	299'753,24	48,729
130 gg	1'148,49	300'901,72	48,915
131 gg	1'148,49	302'050,21	49,102
134 gg	198,28	302'248,49	49,134
135 gg	198,28	302'446,77	49,167
136 gg	198,28	302'645,05	49,199
137 gg	198,28	302'843,33	49,231
138 gg	1'450,95	304'294,28	49,467
141 gg	3'136,88	307'431,16	49,977
142 gg	2'938,60	310'369,76	50,455
143 gg	2'938,60	313'308,35	50,932
144 gg	7'204,43	320'512,79	52,104
145 gg	7'204,43	327'717,22	53,275
148 gg	5'788,69	333'505,91	54,216
149 gg	4'265,83	337'771,74	54,909
150 gg	4'265,83	342'037,57	55,603
151 gg	4'265,83	346'303,41	56,296
152 gg	4'265,83	350'569,24	56,990
155 gg	4'265,83	354'835,07	57,683
156 gg	4'265,83	359'100,90	58,377
157 gg	4'265,83	363'366,73	59,070
158 gg	5'974,28	369'341,02	60,041
159 gg	5'974,28	375'315,30	61,012
162 gg	5'289,47	380'604,77	61,872
163 gg	4'040,75	384'645,52	62,529
164 gg	4'040,75	388'686,28	63,186
165 gg	4'040,75	392'727,03	63,843
166 gg	459,74	393'186,76	63,918
169 gg	1'425,59	394'612,35	64,149
170 gg	1'425,59	396'037,93	64,381
171 gg	1'425,59	397'463,52	64,613
172 gg	1'425,59	398'889,11	64,845
173 gg	1'425,59	400'314,69	65,076
177 gg	1'855,87	402'170,56	65,378

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
178 gg	1'855,87	404'026,43	65,680
179 gg	1'855,87	405'882,30	65,981
180 gg	2'555,22	408'437,52	66,397
183 gg	3'361,34	411'798,86	66,943
184 gg	3'361,34	415'160,20	67,490
185 gg	3'361,34	418'521,54	68,036
186 gg	3'361,34	421'882,87	68,583
187 gg	5'293,78	427'176,65	69,443
190 gg	3'062,07	430'238,72	69,941
191 gg	3'062,07	433'300,80	70,439
192 gg	3'062,07	436'362,87	70,936
197 gg	3'223,00	439'585,87	71,460
198 gg	3'223,00	442'808,87	71,984
199 gg	1'290,56	444'099,42	72,194
201 gg	1'290,57	445'389,99	72,404
204 gg	196,10	445'586,09	72,436
206 gg	196,10	445'782,19	72,468
207 gg	196,10	445'978,29	72,500
208 gg	196,10	446'174,40	72,531
211 gg	196,10	446'370,50	72,563
212 gg	196,10	446'566,60	72,595
213 gg	1'473,33	448'039,93	72,835
214 gg	1'473,33	449'513,26	73,074
215 gg	1'473,33	450'986,59	73,314
218 gg	1'473,33	452'459,92	73,553
219 gg	1'473,33	453'933,24	73,793
220 gg	1'473,33	455'406,57	74,032
221 gg	1'473,33	456'879,90	74,272
222 gg	1'277,23	458'157,13	74,479
225 gg	1'423,13	459'580,26	74,711
226 gg	1'423,13	461'003,39	74,942
227 gg	1'423,13	462'426,53	75,173
228 gg	2'992,14	465'418,67	75,660
229 gg	7'257,98	472'676,65	76,840
232 gg	7'112,07	479'788,72	77,996
233 gg	7'112,07	486'900,79	79,152
234 gg	7'112,07	494'012,85	80,308
235 gg	7'112,07	501'124,93	81,464
236 gg	4'265,83	505'390,76	82,158
239 gg	4'265,83	509'656,59	82,851

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
240 gg	4'265,83	513'922,42	83,545
241 gg	4'265,83	518'188,25	84,238
242 gg	4'265,83	522'454,09	84,932
243 gg	4'265,83	526'719,92	85,625
246 gg	4'265,83	530'985,75	86,319
247 gg	4'265,83	535'251,58	87,012
248 gg	4'265,83	539'517,41	87,706
249 gg	4'265,83	543'783,25	88,399
250 gg	4'265,83	548'049,08	89,093
253 gg	1'738,16	549'787,24	89,375
254 gg	1'738,16	551'525,40	89,658
255 gg	1'738,16	553'263,57	89,940
256 gg	5'195,70	558'459,26	90,785
257 gg	5'195,70	563'654,97	91,629
260 gg	3'457,53	567'112,50	92,192
261 gg	3'457,53	570'570,03	92,754
262 gg	2'231,71	572'801,74	93,116
263 gg	2'231,71	575'033,44	93,479
264 gg	2'231,71	577'265,15	93,842
267 gg	6'249,90	583'515,04	94,858
268 gg	6'249,90	589'764,94	95,874
269 gg	4'018,19	593'783,13	96,527
270 gg	4'018,19	597'801,32	97,180
271 gg	4'018,19	601'819,51	97,834
275 gg	454,79	602'274,31	97,908
276 gg	454,79	602'729,10	97,981
277 gg	454,79	603'183,89	98,055
278 gg	454,79	603'638,68	98,129
281 gg	454,79	604'093,47	98,203
282 gg	454,79	604'548,27	98,277
283 gg	454,79	605'003,06	98,351
284 gg	454,79	605'457,85	98,425
285 gg	454,79	605'912,64	98,499
288 gg	1'846,69	607'759,33	98,799
289 gg	1'846,69	609'606,02	99,099
290 gg	1'846,69	611'452,72	99,400
291 gg	1'846,69	613'299,41	99,700
292 gg	1'846,69	615'146,10	100,000
MONTIANO, 10/02/2025			

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
Tecnico ARCH. MATTEO BATTISTINI			
