


# COMUNE DI ASCOLI PICENO

REGIONE MARCHE

ASCOLI PICENO

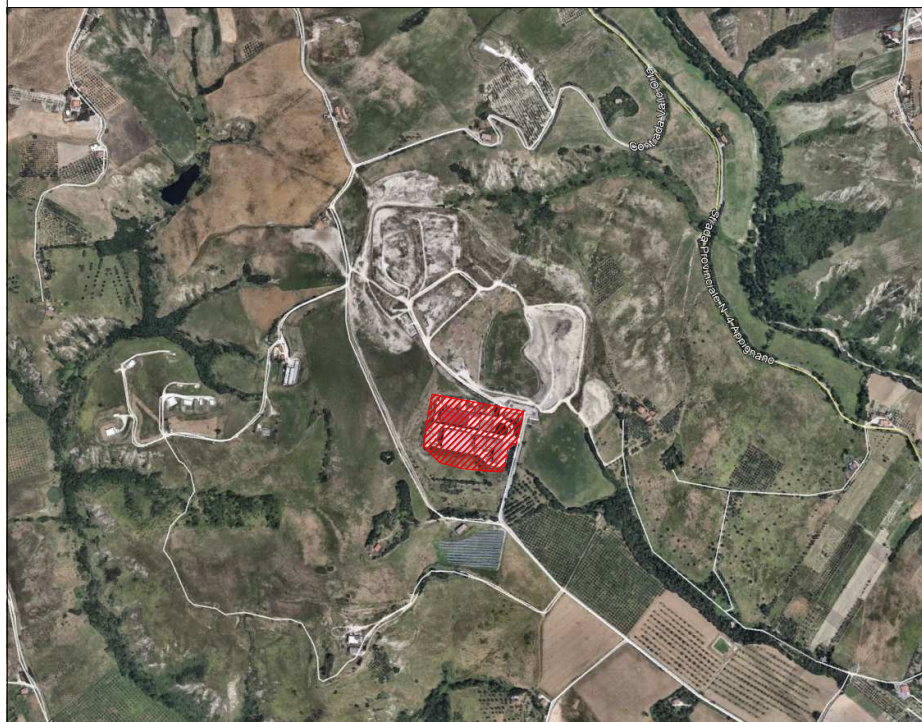

MODIFICA NON  
SOSTANZIALE AIA DEL  
PAUR N.281 DEL  
12/03/2024

## MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA:

ET.04\_A

SCALA:

DATA:  
DIC.2025

#### PROGETTAZIONE



ING. MARCO SCIARRA

ING. SERGIO CIAMPOLILLO

#### COMMITTENTE



ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.  
ANDREA ZAMBRINI

*Andrea Zambrini*



MODIFICA NON SOSTANZIALE PAUR DETERMINAZIONE N.281 DEL 12/03/2024.

### Cronoprogramma dei lavori

## CRONOPROGRAMMA LAVORI

Nel seguito vengono riportati il cronoprogramma in forma tabellare e in forma di grafico. Il cantiere avrà una durata pari a circa 24 mesi.

FASE	ATTIVITA'	Durata (gg)
Fase 0	<b>Ristrutturazione e bonifica capannone TMB</b>	365
Fase 1	<b>Allestimento del cantiere</b>	5
Fase 2	<b>Pulizia area e scotico terreno</b>	25
Fase 3	<b>Sbancamenti</b>	50
Fase 4	<b>Realizzazione opere di fondazione</b>	60
Fase 5	<b>Realizzazione strutture in c.a.p.</b>	150
Fase 6	<b>Realizzazione nuovo biofiltro</b>	40
Fase 7	<b>Posa tubazioni, impianti, pozzetti e cordoli</b>	60
Fase 8	<b>Impiantistica strutture</b>	60
Fase 9	<b>Rimozione del cantiere</b>	5

N.B. La fase 0 avrà inizio dalla comunicazione ufficiale da parte dell'ATA dei fondi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, in quanto tali interventi saranno attuabili a seguito della conclusione del procedimento di trasferimento della proprietà dell'impianto TMB dalla Regione Marche all'ATO 5AP.



MODIFICA NON SOSTANZIALE PAUR DETERMINAZIONE N.281 DEL 12/03/2024.

**Cronoprogramma dei lavori**

