PLANIMETRIA DI CANTIERE

Scala 1:300

Legenda

- Recinzione esistente
- Ponteggio a telai prefabbricati

Note per l'esecuzione dei lavori

- Durante le lavorazioni dovranno essere presenti all'interno della medesima area i seguenti dispositivi:
  - Cassetta di primo soccorso;
  - Estintore portatile a polvere con capacità estinguente almeno pari a 34A-233BC;
- L'accesso all'area di cantiere deve essere consentito ai soli addetti ai lavori. Va pertanto verificato che la recinzione dell'area di cantiere sia sempre integra e chiusa.
- L'accesso al cantiere dovrà avvenire tramite il cancello veicolare su via Piobesi. Eventuali altri accessi o scarico di materiale da punti diversi vanno concordati e approvati dal Coordinatore e dal Direttore Lavori.
- E' prevista la segregazione dell'area di cantiere mediante la recinzione esistente del lotto. Eventuali ponteggi o altre opere che dovessero necessariamente uscire dall'area di pertinenza del complesso scolastico andranno chiuse con rete di plastica stampata, protette e segnalate, previa approvazione del Coordinatore e del Direttore Lavori.
- All'interno del cantiere dovranno essere depositati solamente i materiali necessari alle lavorazioni in fase di esecuzione. Il deposito degli stessi, quindi, va eseguito per lo stretto necessario nelle aree esterne designate.
- Eventuali accessi ai locali interni del complesso scolastico vanno richiesti al Comune, previa verifica delle necessarietà da parte del Direttore Lavori. Le lavorazioni vanno in ogni caso effettuate nel periodo di assenza dell'attività scolastica per evitare qualsiasi interferenza.

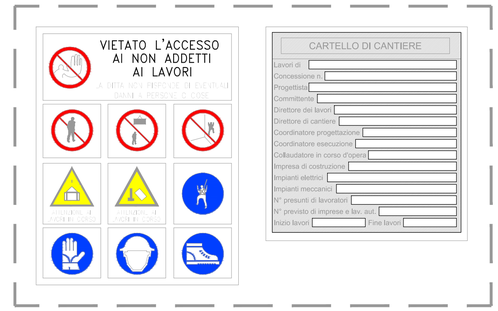

STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI
studio di ingegneria

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI VENZONE



LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI VENZONE - LOTTO 2
CUP I44H21000020001

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Venzone
Piazza Municipio, 1
33010 - Venzone (UD)

PROGETTISTA
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere

TITOLO
SICUREZZA CANTIERI
PLANIMETRIA DI CANTIERE

SCALA	DATA	INC	TAV		REV
---	22/12/2022	RA810	PE	SIC-01	0

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	22/12/2022	Prima emissione	F. Panzacchi

FILE RA810PESIC-01R0.dwg

Tutti i diritti riservati e tutelati a norma di Legge. La riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è consentita esclusivamente a seguito di autorizzazione del progettista.

Via Marini 9 - 33100 UDINE - t +39 0432 292036 - f +39 0432 292037 - info@rosellisassociati.it - info@pec.rosellisassociati.it - C.F. - P.IVA. 02503050303
