PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017719 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:37

ISTANZA DI

AUTORIZZAZIONE UNICA

ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25/11/2024, n.190

INDIRIZZO

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

provincia di ASTI

Terreno sito in Località Corveglia

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

PROPONENTE

RENPV7 s.r.l.

C.F./P.IVA 13856320968

Via Malipiero 16/18 - 20138 Milano (MI)

renpv7@pec.snam.it

PROTOCOLLO	SCALA	PROGETTO		
		PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO
F-2023-087	---	☐	☒	☐

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI

TITOLO DOCUMENTO

DEF_DOC_GEN_03_CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI

AGGIORNAMENTI

Rev. n°	DATA	DESCRIZIONE	TECNICO REDATTORE	AUTORIZZATO
REV00	20 luglio 2026	Prima emissione	Ing. Giuseppe Rossi	☒ SI ☐ NO ☐ BOZZA
				☐ SI ☐ NO ☐ BOZZA
				☐ SI ☐ NO ☐ BOZZA

SVILUPPATORE

ENERGYETIKA SRL SOCIETÀ BENEFIT

C.F. 04117570988

Via Flero 46

25125 Brescia (BS)

Tel: 030 7402683 - www.energyetika.it

energyetika@legalmail.it

FIRME

PROGETTAZIONE

ING. GIUSEPPE ROSSI

C.F. RSSGPP75R07H163Z

P. IVA 05990200825

Via Repubblica Argentina 42

25124 Brescia (BS)

giuseppe.rossi17@ingpec.eu

Dott. Ing. GIUSEPPE ROSSI - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA N° 5010 - BRESCIA

COLLABORATORI

Descrizione sintetica delle fasi realizzative

Il cronoprogramma di seguito riportato articola la realizzazione dell'impianto in nove fasi, per una durata complessiva di circa 44 settimane. Le fasi sono in parte sovrapposte, così da ottimizzare l'impiego delle squadre di lavoro e contenere la durata del cantiere e, con essa, la durata degli impatti sulle componenti ambientali.

Fase 1 – Mobilitazione e preparazione del sito (sett. 1-4). Allestimento dell'area di cantiere, realizzazione della viabilità provvisoria e dei tracciamenti topografici, seguiti dalla posa della recinzione perimetrale e dalla formazione degli accessi.

Fase 2 – Opere civili preliminari (sett. 5-7). Esecuzione degli scavi e delle fondazioni destinate ad accogliere le cabine elettriche di campo e di consegna.

Fase 3 – Viabilità interna (sett. 8-12). Scavi e formazione dei sottofondi stradali, successiva realizzazione della viabilità definitiva con finiture in stabilizzato e materiali drenanti, e completamento delle piazzole di manovra e di accesso alle cabine.

Fase 4 – Infrastrutture elettriche (sett. 9-18). Realizzazione delle cabine elettriche di campo e di consegna e, in parziale sovrapposizione, scavi e posa dei cavidotti di bassa e media tensione e della rete di terra.

Fase 5 – Strutture e moduli fotovoltaici (sett. 17-24). Montaggio delle strutture di supporto e successiva posa dei moduli fotovoltaici.

Fase 6 – Collegamenti elettrici (sett. 25-32). Cablaggi in corrente continua, installazione degli inverter e dei quadri elettrici, quindi esecuzione dei collegamenti in media tensione e delle prove di continuità.

Fase 7 – Collaudi e messa in esercizio (sett. 33-38). Collaudi funzionali e prove di rete, perfezionamento della richiesta di connessione e successiva attivazione e messa in esercizio dell'impianto.


Fase 8 – Opere di mitigazione ambientale (sett. 5-8 e sett. 41-42). Realizzazione delle piantumazioni, delle fasce arboree e arbustive perimetrali, delle opere di drenaggio e delle opere compensative; a chiusura del cantiere, sistemazioni finali e rimozione delle aree logistiche.

Si evidenzia che le piantumazioni e le fasce arboree previste dalle opere di mitigazione non sono rimandate alla conclusione dei lavori, ma vengono eseguite nelle fasi preliminari della realizzazione (settimane 5-8), in parallelo alle opere civili preliminari e prima del montaggio delle strutture e dei moduli. Tale anticipazione consente alle essenze messe a dimora di avviare l'attecchimento e lo sviluppo vegetativo già durante la costruzione dell'impianto, così che la funzione di mascheramento e di inserimento paesaggistico risulti efficace sin dalla messa in esercizio; contestualmente, le fasce vegetate e le opere di drenaggio realizzate in avvio di cantiere svolgono una funzione di contenimento delle polveri e di regimazione delle acque superficiali per l'intera durata dei lavori. Alla conclusione del cantiere sono previste le sole sistemazioni finali e le eventuali integrazioni delle fallanze.

Fase 9 – Preparazione del terreno per le colture (sett. 43-44). Sistemazione degli impianti irrigui, semina e successive lavorazioni post-semina, con ripristino della piena funzionalità agronomica delle superfici interessate.

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017719 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:37

N°	Fase	Attività	Durata (settimane)	Sett. inizio	Sett. fine
1	**Mobilitazione e preparazione del sito**	Allestimento cantiere, viabilità provvisoria, tracciamenti	2	1	2
		Recinzione perimetrale e accessi	2	3	4
2	**Opere civili preliminari**	Scavi e fondazioni per cabine elettriche	3	5	7
3	**Viabilità interna**	Scavi e sottofondi stradali	2	8	9
		Realizzazione viabilità definitiva (stabilizzato, drenante, ecc.)	3	9	11
		Piazzole di manovra e accesso cabine	1	12	12
4	**Infrastrutture elettriche**	Realizzazione cabine elettriche di campo e di consegna	8	9	16
		Scavi e posa cavidotti (BT/MT/terra)	6	13	18
5	**Strutture e moduli FV**	Montaggio strutture di supporto (fisse o tracker)	4	17	20
		Posa moduli fotovoltaici	4	21	24
6	**Collegamenti elettrici**	Cablaggi DC, installazione inverter, quadri elettrici	6	25	30
		Collegamenti MT e test di continuità	2	31	32
7	**Collaudi e messa in esercizio**	Collaudi funzionali, prove di rete, richiesta connessione	4	33	36
		Attivazione impianto e messa in esercizio	2	37	38
8	**Opere di mitigazione ambientale**	Piantumazioni, fasce arboree, drenaggi, opere compensative	4	5	8
		Sistemazioni finali e rimozione cantiere	2	41	42
9	**Preparazione del terreno per le colture**	Sistemazioni impianti irrigui, semina e sistemazioni post-semina	2	43	44

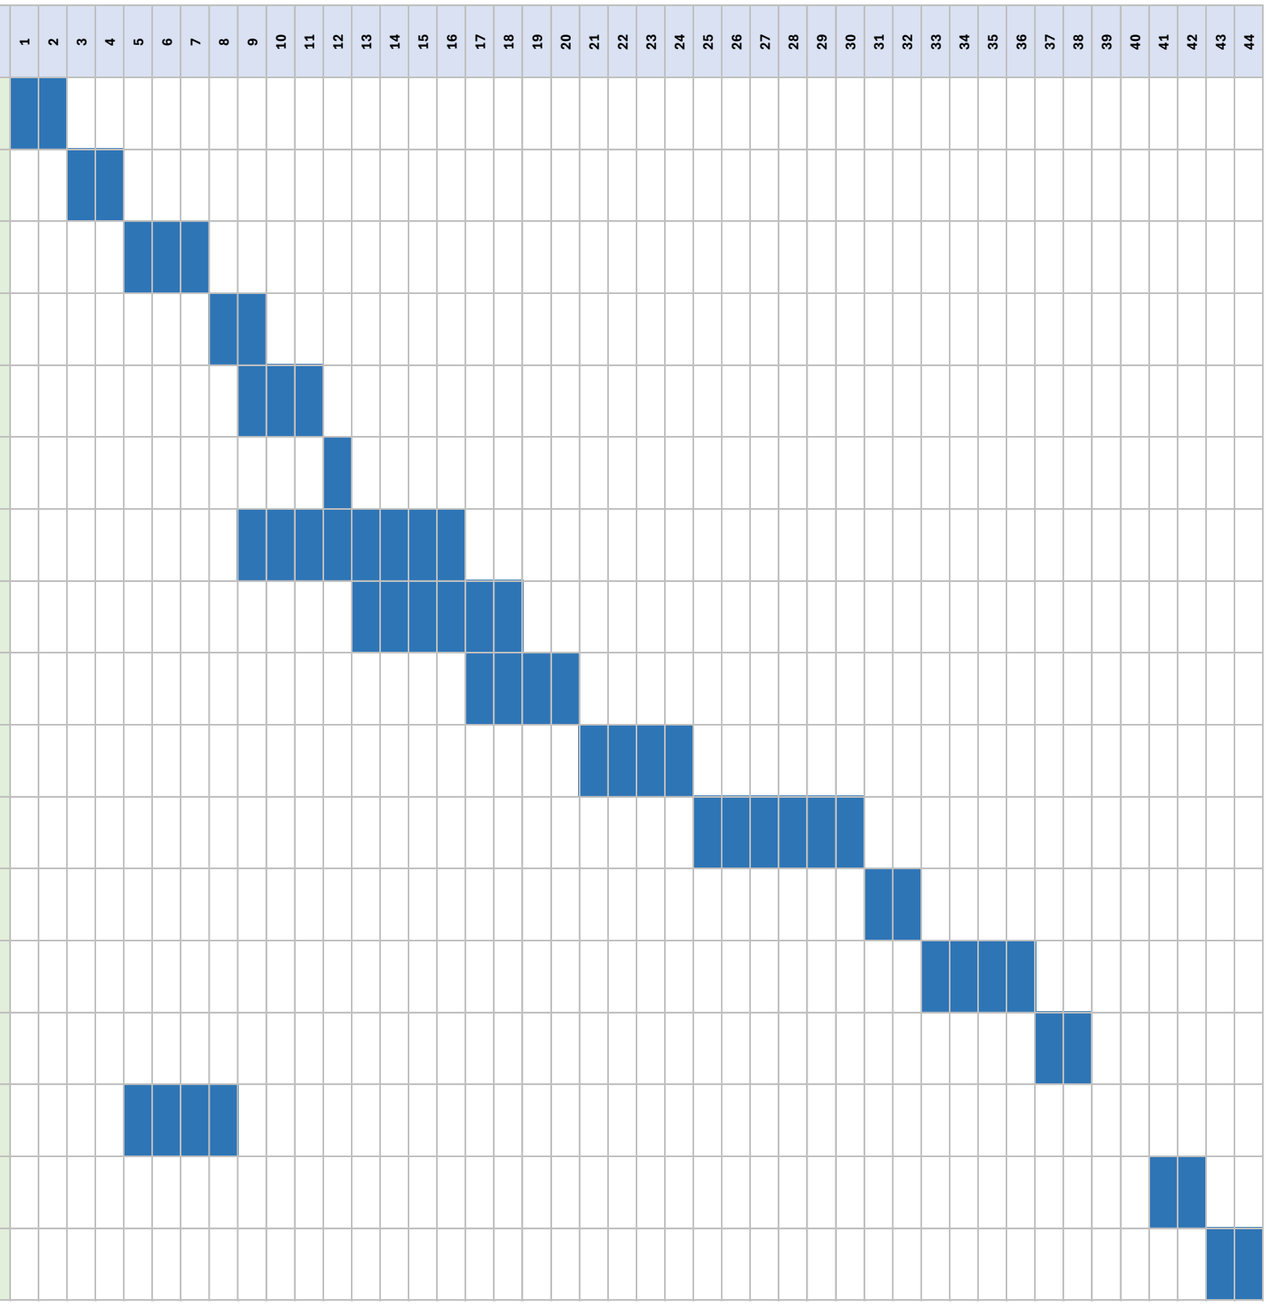

Durata complessiva dei lavori **44 settimane**

Nota: il cronoprogramma ha valore indicativo e può subire variazioni per condizioni atmosferiche, ritardi nelle forniture, adempimenti del distributore di rete o cause di forza maggiore non imputabili al proponente.
