ALLEGATO 1

FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	**Lavori per la posa e la sostituzione di tronchi di linea BT in cavo aereo e di n°12 sostegni BT, per soddisfare la richiesta di nuova fornitura del cliente "COMUNE DI CASALETTO SPARTANO", nel tenimento del Comune di Casaletto Spartano (SA).** **ATENA 60570500**

☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)

☐ Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento, considerando anche il DM 52/2015, ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

☐ Si indicare quale tipologia: ……..

☐ No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

☐ Si indicare quali risorse: ……..

X No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

☐ Si

X No

☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

*considerare anche le Linee Guida https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846 e altre eventuali Linee Guida dello stesso progetto Creiamo PA https://creiamopa.minambiente.it/index.php

ALLEGATO 1

Tipologia P/P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici* ☐ *Calendari venatori/ittici* ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici* ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi……* ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☐ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.* ***X*** *Altro (specificare)* L'impianto di cui al presente progetto consiste nella posa e la sostituzione di tronchi di linea BT in cavo aereo e di n°12 sostegni BT.
Proponente (responsabile del procedimento)	Ing. Flavia Camberlingo residente per la carica in Via Giuseppe Mezzacapo 27 – 84036 Sala Consilina (SA) - Codice Fiscale [redacted], procuratrice pro tempore di e-distribuzione S.p.A. Unità Territoriale di Sala Consilina., con sede legale in Roma via Cimarosa,4 partita I.V.A. 15844561009, pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: CAMPANIA Comune: CASALETTO SPARTANO Prov.: SA Località/Frazione: VIA AFFONNATORE				*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali X **Zona Periurbana**
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*				

ALLEGATO 1

Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)* S.R.: ……	LAT.	**40.136577° N**	**40.139542° N**	**40.139582° N**	**40.139685° N**	
	LONG.	**15.695363° E**	**15.691568° E**	**15.691306° E**	**15.690054° E**	

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

……

……

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000


pSIC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
SIC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT 8050022	***"Montagne di Casalbuono"***
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 ? ☒ Si ☐ No

Citare, gli atti consultati:

Deliberazione Giunta Regionale **n. 617 DEL 14/11/2024** e **Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (Misure di Conservazione delle ZSC IT8050022 "MONTAGNE DI CASALBUONO")**

ALLEGATO 1

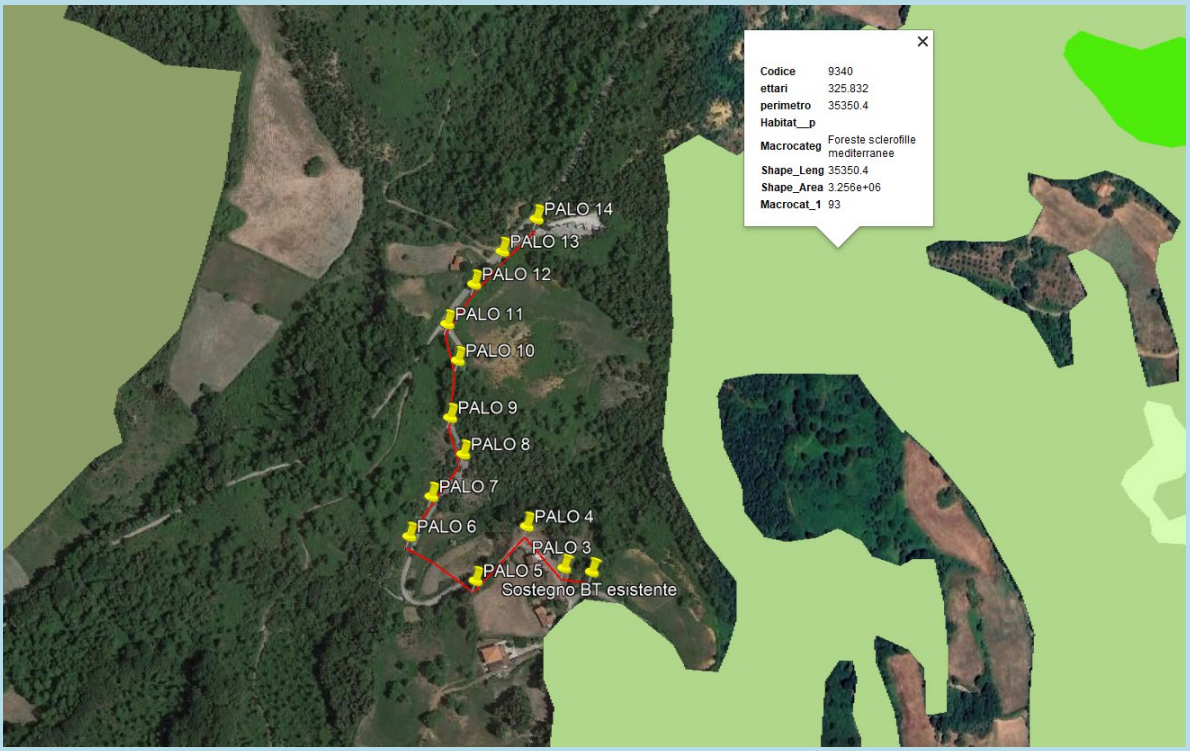

Secondo il link "Layer poligoni" pubblicato sul portale della REGIONE CAMPANIA IL 09.12.2025 L'INTERVENTO **NON** interessa Habitat di "interesse comunitario".

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☒ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*diverso dal Sentito e se disponibile e già rilasciato*): …… ……

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

ALLEGATO 1


☐ Si ☒ No

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

L'impianto di cui si chiede autorizzazione al COMUNE prevede:

Planimetria delle coordinate dei punti significativi

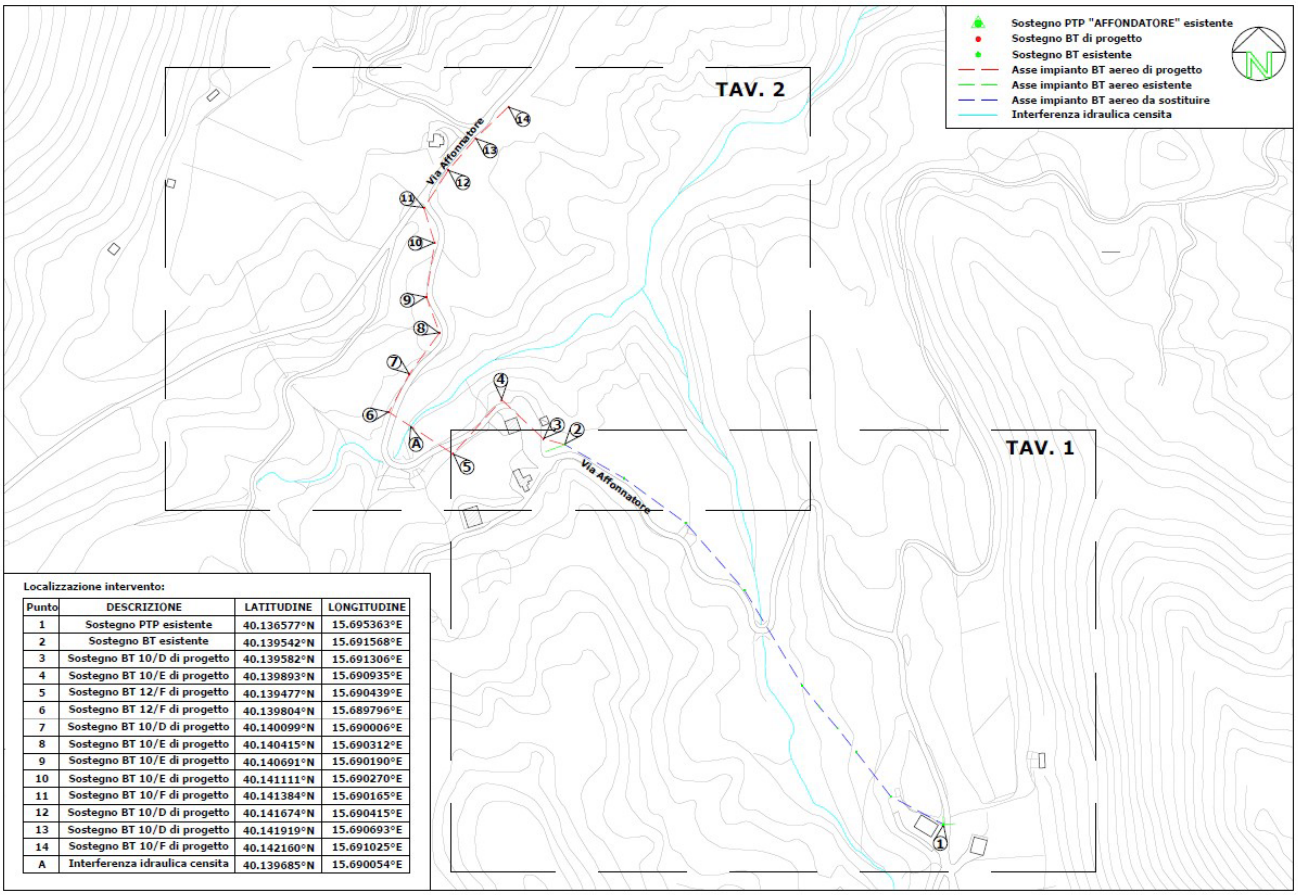

Localizzazione intervento:

Punto	DESCRIZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Sostegno PTP esistente	40.136577°N	15.695363°E
2	Sostegno BT esistente	40.139542°N	15.691568°E
3	Sostegno BT 10/D di progetto	40.139582°N	15.691306°E
4	Sostegno BT 10/E di progetto	40.139893°N	15.690935°E
5	Sostegno BT 12/F di progetto	40.139477°N	15.690439°E
6	Sostegno BT 12/F di progetto	40.139804°N	15.689796°E
7	Sostegno BT 10/D di progetto	40.140099°N	15.690006°E
8	Sostegno BT 10/E di progetto	40.140415°N	15.690312°E
9	Sostegno BT 10/E di progetto	40.140691°N	15.690190°E
10	Sostegno BT 10/E di progetto	40.141111°N	15.690270°E
11	Sostegno BT 10/F di progetto	40.141384°N	15.690165°E
12	Sostegno BT 10/D di progetto	40.141674°N	15.690415°E
13	Sostegno BT 10/D di progetto	40.141919°N	15.690693°E
14	Sostegno BT 10/F di progetto	40.142160°N	15.691025°E
A	Interferenza idraulica censita	40.139685°N	15.690054°E

1) **La posa in proprietà privata di n°4 sostegni del tipo (10/E) [matricola 230252] ancorati al suolo per mezzo di opportuna fondazione in C.A.C. (N.C.T. Comune di Casaletto Spartano Foglio 27 p.lle 271, 40). Le fondazioni avranno le seguenti dimensioni: ml 1.50 x 1.50 x ml 1.20. I sostegni avranno un'altezza fuori terra di 8.40m.**

2) La posa in **proprietà privata** di n°4 sostegni del tipo (10/D) [matricola 230242] ancorati al suolo per mezzo di opportuna fondazione in C.A.C. (N.C.T. Comune di Casaletto Spartano Foglio 27 p.lle 271, 40 e Foglio 24 p.lla 147). Le fondazioni avranno Le seguenti dimensioni: ml 1.20 x 1.20 x ml 1.20. I sostegni avranno un'altezza fuori terra di 8.40 m.

3) La posa in **proprietà privata** di n°2 sostegni del tipo (10/F) [matricola 230262] ancorati al suolo per mezzo di opportuna fondazione in C.A.C. (N.C.T. Comune di Casaletto Spartano Foglio 24 p.lla 147). Le fondazioni avranno le seguenti dimensioni:ml 1.80 x 1.80 x ml 1.20. I sostegni avranno un'altezza fuori terra di 8.40 m.

4) La posa in **proprietà privata** di n°2 sostegni del tipo (12/F) [matricola 230264] ancorati al suolo per mezzo di opportuna fondazione in C.A.C. (N.C.T. Comune di CasalettoSpartano Foglio 27 p.lle 310, 40). Le

fondazioni avranno le seguenti dimensioni: ml 1.70 x 1.70 x ml 1.40. I sostegni avranno un'altezza fuori terra di 10.40 m.

5) La tesatura su **in proprietà privata** e su **Via Affonnatore** di un cavo aereo BT quadripolare ad elica visibile del tipo 3x70+54,6 avente matricola [33 90 13] isolato con XLPE, **per una lunghezza di ml 972.60, di cui 234.80 in sostituzione dell'impianto presente.**

SUPERFICIE TOTALE DI SCAVO = 27.10 MQ

Per la realizzazione delle opere sopra descritte abbiamo valutato n° 32 giornate di cantiere compreso il ripristino.

Foto significative:

Foto 1
Via Affonnatore


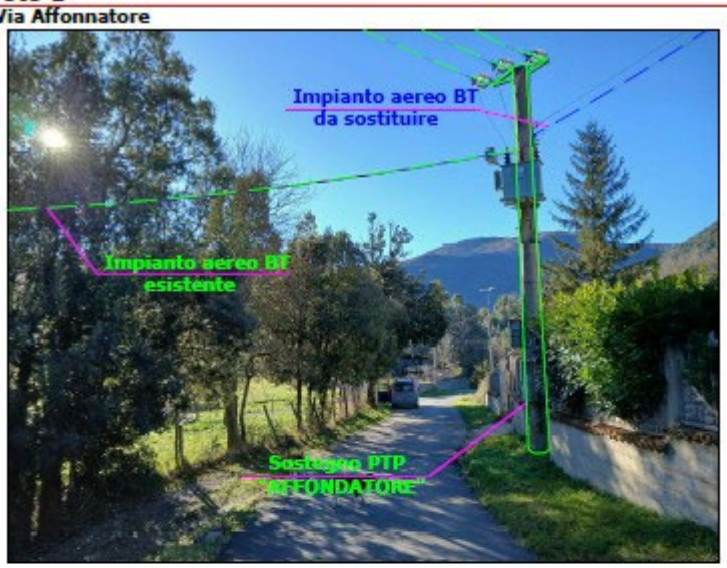


Foto 2
Via Affonnatore

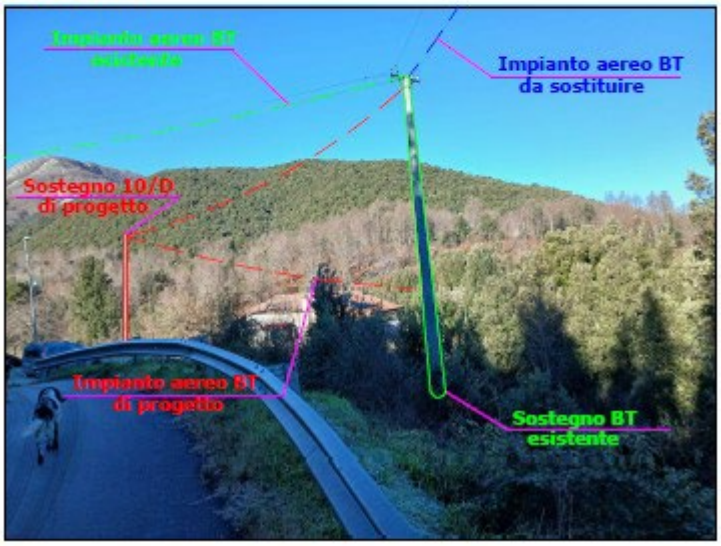

Per una descrizione più dettagliata si rimanda alla descrizione riportata all'interno dell'Elaborato di progetto, dello Studio dei Vincoli e delle cartografie tematiche, allegati alla presente.

ALLEGATO 1

3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti allegati alla proposta)

1) **Elaborato di Progetto** con Ortofoto completo di: cartografia IGM in adeguata scala, Descrizione dell'intervento, Foto ante operam.

2) **Studio dei Vincoli** completo di: cartografie adeguate con l'indicazione delle tipologie vincolistiche presenti nell'area di interesse del progetto.

3) **Cartografia Tematica** Corine Land Cover 2018

4) **Cartografia Tematica** Carta della Natura (Habitat)

5) **Dati Georeferenziati**: formato KML e xls

☐ Eventuali studi ambientali disponibili

☐ Altri elaborati tecnici:
……

☐ Altri elaborati tecnici:
……


☐ Altri elaborati tecnici:
……

☐ Altro:
……

☐ Altro:

……

ISPRA - Carta della Natura - HABITAT

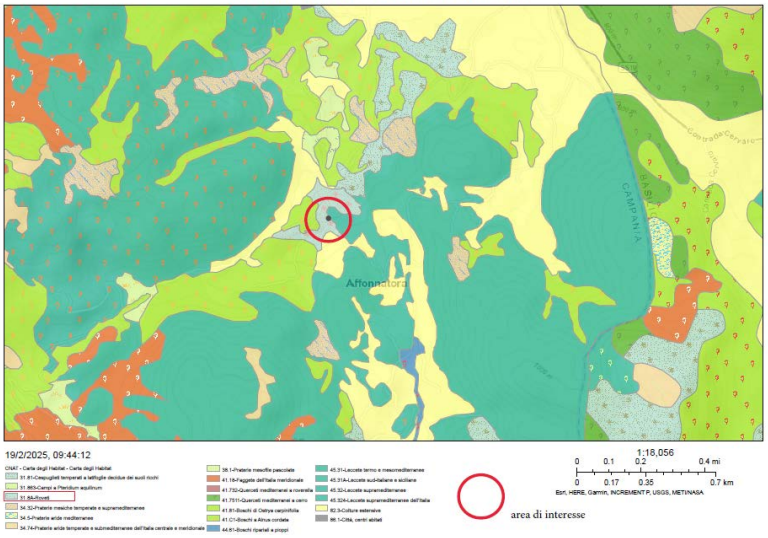

ISPRA - CORINE LAND COVER - 2018



ALLEGATO 1

3.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO *(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)* Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della **Condizioni d'Obbligo**? **X** Si ☐ No	Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta. **PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT8050022 "MONTAGNE DI CASALBUONO"** QUADRO PROPOSITIVO **ART. 6 CONDIZIONI D'OBBLIGO COMMA 6.10 Interventi di manutenzione delle reti impiantistiche**	L'intervento/attività non sottrae superfici classificate come tipi di habitat di all. 1 e/o habitat di specie di all. 2 della Direttiva Habitat **VEDI SEZ.2** • L'intervento/attività non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno e sarà eseguito esclusivamente durante il periodo diurno. **APPLICABILE** • Non saranno realizzate aree di deposito di materiali o di servizio in aree classificate come tipo di habitat di all. I della Direttiva Habitat – **l'INTERVENTO NON PREVEDE AREE CHE INTERESSANO HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO** • Durante i lavori non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione dei terreni che possa modificare la natura dei suoli o alterare la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area dell'intervento **APPLICABILE** • In aree classificate come habitat di all. I, per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di neanche temporaneamente – **L'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO E' PREVALENTEMENTE OCCUPATA DA COLTURE AGRARIE E ROVETI 31.8A ED IN PROSSIMITA' DI UNA STRADA ASFALTATA ESISTENTE** • Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere - **APPLICABILE** • Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento) - **APPLICABILE** • La manutenzione degli elettrodotti prevede la loro sostituzione con cavi interrati o l'adeguamento alle "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" pubblicate dall'ISPRA – **I MATERIALI USATI SONO A NORMA PER EVITARE IL RISCHIO COLLISIONE ED ELETTROCUZIONE COME DA NORMATIVA** • Il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che sovrasta la linea dell'impianto e a quella arborea che eventualmente ostacola lo scavo per accedere all'impianto - **APPLICABILE** • Nell'eventuale stabilizzazione dei versanti la vegetazione presente sarà conservata ad eccezione di quella esotica - **APPLICABILE** • Non saranno lasciati materiali o qualunque altro residuo di cantiere o lavorazione sul posto, ad eccezione di pietre e materiali vegetali - **APPLICABILE** Sarà previsto il ripristino della vegetazione preesistente lungo il tracciato di eventuali scavi - **APPLICABILE**

ALLEGATO 1

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'
(compilare solo parti pertinenti)

E' prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ SI	X NO	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA
Se, **Si**, cosa è previsto: …… ……				
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	X SI ☐ NO		Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ SI X NO
Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……			Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……	
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? X SI ☐ NO **Adeguata segnalazione delle aree interessate dall'intervento.**			Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……	
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ SI X NO		Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività?	☐ SI ☐ NO
Se, **Si**, cosa è previsto: **Sarà individuata un'area sulla strada pubblica esistente per la sistemazione delle attrezzature e lo spazio per poterla raggiungere.**			Se, **Si**, cosa è previsto: …… ……	
E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si ☒ No			Se, **Si**, descrivere: …… …… ……	

ALLEGATO 1

<table>
<tr><td rowspan="1">Specie vegetali</td><td>E’ previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?
☐ SI
☐ NO</td><td colspan="2">Se, SI, descrivere:
……
……
……
……</td></tr>
<tr><td colspan="2">La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?
☐ SI
☐ NO</td><td colspan="2">Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?
☐ SI
X NO

Se, Si, cosa è previsto:
……
……
……
……..
Indicare le specie interessate: ……..</td></tr>
<tr><td rowspan="1">Specie animali</td><td>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?
X SI
☐ NO</td><td colspan="2">Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?
☐ SI
X NO
☐
Se, Si, cosa è previsto:
……
……
……
……..
Indicare le specie interessate: ……..</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezzi meccanici</td><td rowspan="3">Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell’intervento</td><td rowspan="3">➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:
➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):
➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):</td><td>escavatrice</td></tr>
<tr><td>camion</td></tr>
<tr><td>NO</td></tr>
</table>

ALLEGATO 1

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? X SI ☐ NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☒ SI ☐ NO Descrivere: **Durante la fase di cantiere nell'area si produce un disturbo dovuto al rumore causato dalla presenza dei mezzi meccanici e dalla presenza del personale. Possibile produzione di rifiuti di tipo edile da smaltire presso discarica autorizzata.**

Interventi edilizi		
Per interventi edilizi su strutture preesistenti Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento	☐ Permesso a costruire ☐ Permesso a costruire in sanatoria ☐ Condono ☐ DIA/SCIA ☐ Altro ……	Estremi provvedimento o altre informazioni utili: …… …… ……

Manifestazioni		
Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.	➢ Numero presunto di partecipanti: ➢ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➢ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	

Attività ripetute	
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☐ Si ☒ No	Descrivere: …… …… …… …… …… ……

ALLEGATO 1

La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? ☐ Si ☐ No Se, **Si**, allegare e citare precedente parere in "Note".	Possibili varianti - modifiche: …… …… …… …… Note: …… …… ……

SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Tutte le fasi dell'intervento proposto verranno attuate nel pieno rispetto del D.M. del 17.10.2007, della DGR n.2295 del 29.12.2007 e della DGR n. 795 del 19.12.2017. quindi **in periodi distanti da quelli di riproduzione della fauna localmente presente.** **La frazione di rifiuti prodotti sarà gestita nel rispetto del** Dlgs n.152 del 03.04.2006 e della L.R. della Campania n. 20 del 09 Dicembre 2013 art.5 **I lavori saranno programmati in modo da arrecare il minimo disagio al traffico veicolare.**	Leggenda: ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ ……

Anno: 2025	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.				**Periodo escluso riferito alle misure regolamentari del Piano di Gestione pubblicato**				LAVORI LAVORI LAVORI LAVORI	LAVORI LAVORI LAVORI			
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												

ALLEGATO 1

2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e Timbro		Luogo e data
e-distribuzione S.p.A.	Ing. Flavia Camberlingo	e-distribuzione	Firmato digitalmente da Flavia Camberlingo Data: 16/06/2026	
	Dott. Agronomo Salvatore Malatino			

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI Dott. SALVATORE MALATINO N. 730 Sez. A Prov. SA SALERNO

MALATINO SALVATORE
2026.06.15 11:56:28
CN=MALATINO SALVATORE
C=IT
O=CONAF
2.5.4.51=n.iscr.730
PSA/2048 bits
DOTTORE FORESTALE
SALVATORE
MALATINO
